

REZERVACIJA VJENČANJA

Arhitekturni dokument projekta

ADM struktura za planiranje i pregled arhitekture

Informacijski sustav za rezervaciju vjenčanja

Interna aplikacija za upravljanje vjenčanjima, partnerima, cijenama i dokumentima

5

EPOVI

21

ZADACI

4

TIM

9

TABLICE

3

DOKUMENTI

7

TIPOVI PARTNERA

Dokument ID	INF-MEG-001
Verzija	1.0 - prva i jedina radna verzija
Datum	21. travnja 2026.
Status	Aktivna radna verzija
Vrsta	Interna projektna dokumentacija
Pregled	2 asistentice i predmetni profesor
Struktura	ADM faze: Preliminary, A, B, C, D, E, F, G i H

Blaž Perić | Vinko Jakeljić | Jelena Vučić | Marija Musa

Fakultetski projekt | 2026.

0 Kontrola dokumenta

Ovaj dokument je radni arhitekturni opis sustava Rezervacija Vjenčanja. Struktura prati ADM faze kako bi se od poslovnog problema došlo do podatkovne, aplikacijske i tehnološke izvedbe bez skokova u logici. Dokument nije pisan kao formalna certifikacijska predaja, nego kao stvarni alat koji razvojnom timu i akademskim preglednicima daje jasan trag odluka.

Povijest verzija

VERZIJA	DATUM	AUTOR	NAPOMENA
0.1	ožujak 2026.	projektni tim	interni nacrt strukture, opsega i osnovnih odluka
0.9	travanj 2026.	projektni tim	konsolidiran sadržaj, uključeni epovi i tehnički smjer
1.0	21. travnja 2026.	projektni tim	prva i jedina radna verzija za razvoj i pregled

Svrha dokumenta

Svrha dokumenta je uskladiti poslovni opseg, tehničku arhitekturu, podjelu rada po epovima i kriterije prihvata. Nakon usvajanja ove verzije dokument služi kao glavni referentni okvir za razvoj aplikacije i za obrazloženje arhitekturnih izbora tijekom pregleda projekta.

Ciljana publika

- razvojni tim koji implementira backend, frontend i testove po epovima
- akademski preglednici - 2 asistentice i predmetni profesor
- interni korisnik agencije koji treba razumjeti što sustav pokriva, a što ne pokriva

Pokrivenost ADM faza

FAZA	ŠTO SE ISPORUČUJE	OZNAKA	STATUS
Preliminary	kontekst, ograničenja, načela i organizacija tima	1	obuhvaćeno
Faza A	vizija arhitekture, opseg i dionici	2	obuhvaćeno
Faza B	poslovni moduli, tokovi i pravila	3	obuhvaćeno
Faza C	podatkovna i aplikacijska arhitektura	4-5	obuhvaćeno
Faza D	tehnološka arhitektura i kvalitativni zahtjevi	6	obuhvaćeno
Faza E	rješenja po epovima i radni paketi	7	obuhvaćeno
Faza F	redoslijed implementacije i prijelazni plan	7	obuhvaćeno
Faza G	standardi provedbe i definition of done	8	obuhvaćeno
Faza H	rizici i okidači za promjenu arhitekture	8	obuhvaćeno

Preliminary

Kontekst projekta, ograničenja i arhitekturna načela

1.1 Kontekst projekta

Projekt opisuje internu web aplikaciju za agenciju koja organizira vjenčanja. Agencija trenutno koristi ras-trkane alate, uglavnom tablice, poruke i ručne bilješke. Takav način rada usporava izradu ponuda, otežava praćenje partnera i povećava rizik preklapanja termina kod benda, fotografa i sale.

Faza 1 je usmjerena isključivo na vjenčanja, ali arhitektura mora ostati dovoljno čista da kasnije podrži i dru-ga svečana događanja bez promjene osnovne strukture sustava. Zbog toga se već sada biraju rješenja koja ne zaključavaju aplikaciju samo na jedan poslovni scenarij.

1.2 Projektna ograničenja

OGRANIČENJE	PRAKTIČNA POSLJEDICA
Nema autentifikacije i korisničkih računa	sustav je interni alat jedne agencije; nema prijave, uloga ni upravljanja pris-tupom u fazi 1
Jedna agencija i jedan kontekst rada	nema višeklijentske logike, tenant izolacije ni SaaS modela
Web aplikacija kao jedini klijent	mobilna aplikacija nije predmet ove verzije; cilj je stabilan desktop preglednik
MVP razina produkcijske zrelosti	nema naprednog monitoringa, audita, poruka u pozadini ni kompleksne in-frastrukture
Tim od 4 studenta	arhitektura mora omogućiti paralelan rad po epovima bez uskog grla u jednom sloju
Microsoft SQL Server je zadana baza	model i validacije koriste mogućnosti MSSQL-a, uključujući JSON funkcije

1.3 Arhitekturna načela

N1 - Jednostavnost ispred nepotrebne složenosti

Sustav se gradi za interni rad jedne agencije. Sve što ne donosi izravnu vrijednost u fazi 1 ostaje izvan opsega. Time se razvoj usmjerava na stabilne osnovne procese: evidenciju vjenčanja, rad s partnerima, cijene i doku-mente.

N2 - Jedinstveni model partnera

Umjesto posebnih tablica i posebnih CRUD tokova za svaki tip partnera, koristi se generalizirani model partnera i kataloških stavki. Time se dobiva jedna logika za većinu operacija, a posebnosti se drže u JSON poljima gdje to ima poslovnog smisla.

N3 - Cijena mora biti deterministička

Planirana cijena za partnera na vjenčanju mora se moći izračunati jednoznačno za zadani datum. Pravilo prioriteta je jasno: specifični datum, pa posebni dan, pa osnovna cijena. Nakon izračuna, vrijednost se sprema kao snimka kako kasnije promjene u cjeniku ne bi mijenjale povijesni zapis.

N4 - Potvrda ne smije proizvoditi konflikt

Za tipove partnera koji imaju rezervacijski termin potvrda mora proći provjeru preklapanja. Time se poslovno pravilo prebacuje iz ručne provjere u sustav i smanjuje se rizik dvostruke rezervacije.

N5 - Faza 1 mora ostati proširiva

Iako se u ovoj verziji radi samo o vjenčanjima, tablice, moduli i API ugovori ne smiju blokirati buduća proširenja na krštenja, krizme i druga događanja. To je razlog zašto se dio strukture definira dovoljno generički od samog početka.

1.4 Tim i pregled projekta

ULOGA	OSOBA ILI SKUPINA	PRIMARNA ODGOVORNOST
Epic 01	Blaž Perić	temelj sustava, baza, opći model partnera
Epic 02	Vinko Jakeljić	predlošci, vjenčanja, dashboard i detalj
Epic 03	Jelena Vučić	katalog partnera, cijene, CSV, kalendar i kloniranje
Epic 04	Marija Musa	povezivanje partnera s vjenčanjem, konflikti i potvrda
Akademski pregled	2 asistentice i profesor	pregled arhitekture, usklađenost i kvaliteta projekta

ADM - FAZA A

Faza A

Vizija arhitekture, opseg i ključni dionici

2.1 Problem koji sustav rješava

SREDIŠNJI POSLOVNI PROBLEM

Agencija nema jedno mjesto na kojem može voditi vjenčanja, partnere, raspoloživost, cjenike i dokumente. Ručni rad kroz tablice i poruke stvara spor proces izrade ponude, nekonzistentne cijene i stvaran rizik dvostruke rezervacije ključnih partnera.

2.2 Vizija rješenja

Rezervacija Vjenčanja treba postati jedno središnje mjesto za rad agencije. Korisnik mora moći otvoriti vjenčanje, vezati odgovarajuće partnere i njihove usluge, automatski izračunati planirane cijene prema datumu, spriječiti potvrdu konfliktnog termina i na kraju generirati sve potrebne dokumente bez dodatnog ručnog pretpostavljanja.

2.3 Opseg faze 1

U opsegu

- CRUD za vjenčanja i predloške vjenčanja
- CRUD za partnere i njihove kataloške stavke
- MT model cijena: osnovna cijena, posebni dani, specifični datumi
- dodjela partnera na vjenčanje sa snimkom cijene i provizije
- provjera konflikta termina za bend, fotografa i salu
- CSV import i export za kataloge partnera
- PDF dokumenti: ponuda, račun i interni obračun

Izvan opsega

- prijava korisnika, uloge i autorizacija
- portal za klijente ili samostalni pristup partnera
- slanje mailova, SMS obavijesti i online naplate
- mobilna aplikacija i rad u stvarnom vremenu
- više agencija u istoj instalaciji

2.4 Ključni dionici

DIONIČ	ULOŽA	GLAVNA POTREBA
Agencijski djelatnik	glavni korisnik sustava	brzo otvaranje vjenčanja, pregled partnera i generiranje dokumenata
Vlasnik ili voditelj agencije	poslovni pregled i odluke	uvid u cijene, provizije i status realizacije
Razvojni tim	izgradnja sustava	jasni zahtjevi, stabilni API ugovori i podjela rada bez blokada
Akademski preglednici	stručni i nastavni pregled	jasna arhitekturna logika, opravdane odluke i uredna dokumentacija
Vanjski partneri	subjekti evidencije, ne korisnici sustava	točni termini, točni kontakt podaci i točan odabir usluge

2.5 Pokazatelji uspjeha

- svako vjenčanje mora biti moguće otvoriti i voditi bez dodatne vanjske tablice
- partner s preklapajućim terminom ne smije biti potvrđen
- planirana cijena mora se računati automatizmom na temelju datuma
- dokumente za klijenta i interni pregled treba biti moguće generirati iz sustava
- tim mora moći raditi paralelno po epovima nakon završetka temeljnog epica

ADM - FAZA B


Faza B

Poslovna arhitektura, moduli i poslovna pravila

3.1 Poslovni moduli

MODUL	ŠTO RADI	GLAVNI REZULTAT
Vjenčanja	otvara i vodi evidenciju svakog vjenčanja kroz statusni tok	jedinstveni zapis događaja
Predlošci	daje gotove obrasce partnera i napomena za tipične scenarije	brže otvaranje vjenčanja
Partneri	drži bazu svih partnera, kataloga, cijena i posebnih podataka	centralni katalog ponude
Povezivanje	veže partnera i uslugu s konkretnim vjenčanjem	snimka plana, cijene i provizije
Dokumenti	pretvara podatke iz sustava u ponudbeni i obračunski izlaz	PDF i CSV izlazi

3.2 Glavni poslovni tok faze 1



3.3 Status vjenčanja

Vjenčanje prolazi kroz linearni tok. Otkazivanje je dopušteno iz bilo kojeg aktivnog stanja, ali povratak iz terminalnog stanja nije dio faze 1.



bilo koje aktivno stanje -> CANCELLED

TEHNIČKA VRIJEDNOST	PRIKAZ KORISNIKU	ZNAČENJE
PREPARATION	U pripremi	osnovni podaci su otvoreni, partneri se tek slazu
CONFIRMED	Potvrđeno	događaj ide dalje i ulazi u završnu pripremu
COMPLETED	Završeno	događaj je održan i financijski zatvoren

Otkazano

događaj je prekinut i više se ne vodi kao aktivan

3.4 Status partnera na vjenčanju

Svaki partner povezan s vjenčanjem ima vlastiti statusni tok. Potvrda partnera je poslovno značajna jer tada mogu nastati rezervacija termina i obveza unosa stvarne cijene.

PROPOSED

->

OFFERED

->

CONFIRMED

bilo koje stanje -> CANCELLED

PRIJELAZ	UVJET ILI POSLJEDICA
PROPOSED -> OFFERED	partner je uključen u ponudu ili je agencija započela službeni kontakt
OFFERED -> CONFIRMED	unesena je stvarna cijena i nema konflikta termina ako partner koristi rezervacije
CONFIRMED -> CANCELLED	zapis ostaje vidljiv, a rezervacija se briše ako je postojala

3.5 Ključna poslovna pravila

- partner može biti dodijeljen vjenčanju i bez potvrde, ali potvrda traži strožu validaciju
- provizija agencije sprema se kao snimka u trenutku dodjele partnera na vjenčanje
- stvarna cijena je obavezna kad partner prelazi u stanje CONFIRMED
- završni račun i interni obračun imaju smisla tek kada svi ključni partneri imaju potvrđen status
- SONG stavke u katalogu benda služe za playlistu i ne smiju ulaziti u financijski izračun

3.6 Predlošci vjenčanja kao poslovni akcelerator

PREDLOŽAK	NAMJENA	TIPIČNI PARTNERI
Malo vjenčanje	manji broj gostiju i jednostavnija organizacija	sala, fotograf, slastičar
Veliko vjenčanje	veći broj gostiju i više paralelnih obveza	sala, bend, fotograf, cvječar, torta
Vjenčanje u prirodi	otvorena lokacija i veći logistički rizik	catering, bend, fotograf, cvječar
Vjenčanje cijeli dan	dogadjaj traje od jutra do kasno navečer	sala, bend, fotograf, cvječar, slastičar
Samo sala	fokus na lokaciji, meniju i osnovnom protoku	sala, DJ ili bend, slastičar

ADM - FAZA C (PODACI)

Faza C

Podatkovna arhitektura i struktura poslovnih zapisa

4.1 Pregled podatkovne arhitekture

Podatkovni sloj se izvodi nad Microsoft SQL Serverom, a model se održava kroz EF Core code first migracije. Jezgra modela je generalizirani partner koji može imati različite tipove usluga, proizvoda i pjesama bez širenja baze dodatnim tablicama za svaki pojedini tip partnera.

4.2 Glavni entiteti

ENTITET	SVRHA	KLJUČNI ATRIBUTI
PartnerTypes	definira tip partnera i podatak ima li partner rezervaciju termina	Code, Name, HasBooking
Partners	osnovni zapis svakog partnera	Name, PartnerTypeId, Commission-Percent

PartnerCatalogItems	sve usluge, proizvodi i pjesme partnera	ItemType, BasePrice, Metadata
PricingRules	posebni dani i specifični datumi za cijene	RuleType, DayOfWeek, SpecificDate, Price
BandMembers	članovi benda i njihove uloge	PartnerId, Name, Role
WeddingTemplates	predlošci za otvaranje vjenčanja	RequiredPartnerTypes, ActivityOrder
Weddings	glavni zapis vjenčanja	Name, DateTime, Location, Status
WeddingPartners	veza partnera i vjenčanja	PlannedPrice, ActualPrice, CommissionPercent, Status
Bookings	rezervacije termina za konfliktne partnere	PartnerId, StartDateTime, EndDateTime

4.3 Generalizirani model partnera

ZAŠTO JEDAN MODEL, A NE MNOGO TABLICA

Bend, cvječar, fotograf i sala nude različite stvari, ali sve te stvari u sustavu postaju kataloške stavke partnera. Time se dobiva jedan CRUD tok, jedan API obrazac i jedan skup pravila za cijene. Posebnosti se pohranjuju u Metadata JSON polje umjesto u dodatne specijalizirane tablice.

Ključevi odnosa

- jedan partner ima više kataloških stavki
- jedna kataloška stavka može imati više pravila cijena
- jedno vjenčanje ima više povezanih partnera
- jedan povezani partner može generirati najviše jednu aktivnu rezervaciju termina

4.4 JSON polja koja arhitektura koristi

POLJE	NAMJENA
Partners.ExtraFields	dodatne vrijednosti koje ovise o tipu partnera, npr. kapacitet sale ili dodatna oprema
PartnerCatalogItems.Metadata	detalji pojedine usluge ili proizvoda, npr. trajanje, sastav, broj porcija ili uključene stavke
WeddingTemplates.RequiredPartner-Types	popis tipova partnera koje predložak očekuje i oznaka jesu li obavezni
WeddingTemplates.ActivityOrder	preporučeni redoslijed aktivnosti za konkretan tip vjenčanja
PartnerTypes.FieldSchema	rezervirano proširenje za buduće dinamične forme po tipu partnera

4.5 MT pravilo cijena

PRIORITET IZRAČUNA CIJENE

Sustav uvijek najprije provjerava postoji li cijena za specifični datum. Ako ne postoji, provjerava postoji li cijena za posebni dan u tjednu. Tek ako nijedno od ta dva pravila nije primjenjivo, koristi se osnovna cijena sa same kataloške stavke. Time je rezultat predvidiv i lako provjerljiv.

```
function izracunajCijenu(stavka, datumVjencanja) {  
  if (postojiSpecifichniDatum(stavka, datumVjencanja)) return cijenaSpecifichnogDatuma  
  if (postojiPosebniDan(stavka, datumVjencanja)) return cijenaPosebnogDana  
  return stavka.basePrice  
}
```

4.6 Financijska pravila zapisa WeddingPartners

- PlannedPrice se sprema pri dodjeli partnera i ne mijenja se retroaktivno promjenom cjenika
- ActualPrice se unosi pri potvrdi i predstavlja realnu dogovorenu cijenu partnera
- CommissionPercent se kopira s partnera u trenutku dodjele kako bi povijesni zapis ostao stabilan
- commissionAmount i clientPrice računaju se pri čitanju i nisu nužno trajno pohranjeni

Faza C

Aplikacijska arhitektura, moduli i API ugovori

5.1 Slojevi sustava

Rješenje koristi klasičnu troslojnu strukturu: React aplikaciju za korisničko sučelje, .NET 9 Web API za poslovnu logiku i Microsoft SQL Server za trajnu pohranu podataka. Takva podjela je dovoljno jednostavna za studentski projekt, a istodobno dovoljno jasna za buduće proširenje.

PREZENTACIJSKI SLOJ

React + TypeScript + Vite | port 3000

forme, tablice, dashboard, prikaz statusa, preuzimanje dokumenata

HTTP JSON API

APLIKACIJSKI SLOJ

.NET 9 Web API | port 5000

kontroleri, servisi, validacija, izračun cijena, konflikti i generiranje izlaza

EF Core + SQL

PODATKOVNI SLOJ

Microsoft SQL Server | port 1433

relacijski model, JSON polja, integritet i indeksiranje za osnovne upite

5.2 Moduli i odgovornosti po slojevima

MODUL	BACKEND ODGOVORNOST	FRONTEND ODGOVORNOST
Temelj	DbContext, seed podaci, globalna obrada grešaka, osnovna infrastruktura	routing, osnovni layout, API klijent i error boundary
Partneri	CRUD za partnere, kataloge, pravila cijena i članove benda	lista partnera, detalj partnera i upravljanje katalogom
Vjenčanja	CRUD za predloške i vjenčanja, statusna pravila	dashboard, forme i detalj vjenčanja
Povezivanje	dodjela partnera na vjenčanje, izračun cijene i konflikti termina	tab partnera na vjenčanju, statusne akcije i sažetci
Dokumenti	PDF i CSV servisi, priprema podataka za ispis	okidanje preuzimanja i pregled stanja spremnosti

5.3 API dogovori

- svi odgovori koriste standardni omotac s data i error poljima
- entiteti baze se ne izbacuju direktno prema klijentu, nego preko DTO sloja
- validacija se provodi na backendu, a frontend radi osnovne korisničke provjere
- statusi se u bazi spremaju kao string vrijednosti radi čitljivosti i lakšeg debugiranja

```
{
  "data": {},
  "error": null
}
```

5.4 Primarni endpointi

METODA	RUTA	NAMJENA
GET / POST	/api/partners	lista partnera i otvaranje novog partnera
GET / PUT / DEL	/api/partners/{id}	detalj, izmjena i deaktivacija partnera
POST	/api/partners/{id}/clone	dubinsko kopiranje partnera i kataloga
GET / POST	/api/partners/{id}/catalog-items	pregled i unos kataloških stavki
GET / POST	/api/wedding-templates	predlošci vjenčanja
GET / POST	/api/weddings	lista i kreiranje vjenčanja
POST	/api/weddings/{id}/status	promjena statusa vjenčanja
GET / POST	/api/weddings/{id}/partners	dodjela partnera na vjenčanje
POST	/api/weddings/{id}/partners/{wpId}/confirm	potvrda partnera uz stvarnu cijenu i provjeru konflikta
POST	/api/weddings/{id}/offer	PDF ponuda za klijenta
POST	/api/weddings/{id}/invoice	PDF konačni račun za klijenta
POST	/api/weddings/{id}/report	PDF interni obračun agencije

ADM - FAZA D

Faza D

Tehnološka arhitektura i kvalitativni zahtjevi

6.1 Tehnološki stack

SLOJ	TEHNOLOGIJA	VERZIJA	RAZLOG ODABIRA
Backend	.NET 9 Web API	9.0	jasan REST model, dobar rad s EF Coreom i poznat akademski stack
Frontend	React + TypeScript + Vite	18 / 5	brza izrada sučelja i dobar razvojni tok za timski rad
Baza	Microsoft SQL Server	2022	zadani akademski kontekst i dobra podrška za relacije i JSON
ORM	Entity Framework Core	9.0	code first migracije i tipizirani rad s bazom
PDF	QuestPDF	aktualno	jednostavno generiranje preglednih PDF dokumenata
CSV	CsvHelper	aktualno	stabilan import i export tablicnih podataka
Validacija	FluentValidation	aktualno	čista odvojenost pravila od kontrolera

6.2 Razvojna topologija

```
radna stanica
|
+-- /frontend  Vite razvojni server    :3000
|   +-- src/pages, src/components, src/services
|
+-- /backend    .NET 9 Web API          :5000
|   +-- Controllers, Services, DTOs, Data, Validators
|
+-- SQL Server  RezervacijaVjencanja    :1433
```

6.3 Nefunkcionalni zahtjevi

PODRUČJE	ZAHTJEV	ARHITEKTURNI ODGOVOR
Održavanje	tim mora moći razumjeti i proširivati sustav bez velikog refaktora	jedinstveni model partnera, DTO sloj i servisna logika

Pouzdanost	kritični poslovni tokovi ne smiju ovisiti o ručnoj provjeri	automatiziran izračun cijena i provjera konflikta termina
Proširivost	faza 2 treba dodati nova događanja bez pucanja strukture	generička tablica partnera i predlošci s JSON definicijama
Učinkovitost rada	korisnik mora brzo doći do informacije i izlaza	dashboard, sažetci i generiranje PDF-a iz postojećih zapisa

6.4 Sigurnosni okvir faze 1

NAPOMENA O SIGURNOSTI

U ovoj fazi nema autentifikacije ni kontrole pristupa. To je prihvaćeno samo zato što je sustav namijenjen internoj uporabi jedne agencije u kontroliranom okruženju. Ako projekt prijeđe u širi produkcijski rad, zahtjev za prijavom korisnika automatski postaje okidač za promjenu arhitekture.

ADM - FAZE E I F


Faze E i F

Plan provedbe, epovi i redoslijed isporuke

7.1 Plan rada po epovima

EPIC	NAZIV	NOSITELJ	OVISNOST	PROCJENA
01	Temelj sustava i generalizirani partneri	Blaž Perić	nema - blokira sve ostalo	~12 dana
02	Vjenčanja i predlošci	Vinko Jakeljić	Epic 01 - baza i temeljni API	~9 dana
03	Katalog partnera i upravljanje	Jelena Vučić	Epic 01 dovršen	~16 dana
04	Povezivanje partnera s vjenčanjem	Marija Musa	Epic 01 + dio Epic 02	~10 dana
05	Dokumenti i export	podijeljeno	Epic 02, 03 i 04	raspodijeljeno

7.2 Redoslijed isporuke

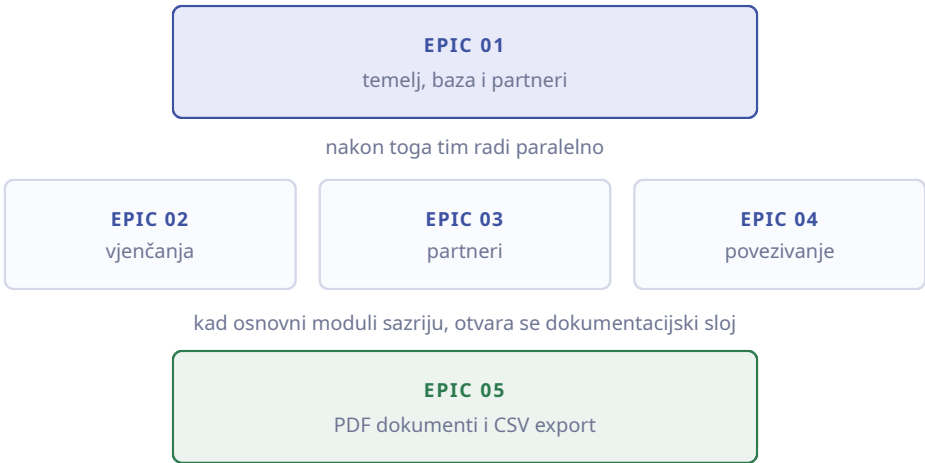

7.3 Buduća proširenja za koja se sada priprema teren

BUDUĆA FAZA	SADRŽAJ	KAKO TRENUTNA ARHITEKTURA POMAŽE
Faza 2	krštenja, krizme i druga događanja	struktura partnera i cijena već je generička; mi- jenja se ponajprije glavni entitet događaja

Faza 3	portal za klijente i obavijesti	REST API se može otvoriti dodatnom klijentu bez lomljenja domenske logike
Faza 4	autentifikacija i uloge	DTO i servisni sloj olakšavaju dodavanje kontrole pristupa bez mijenjanja cijelog sučelja
Faza 5	više agencija	trenutni model je dobra osnova, ali tada treba uvesti tenant logiku i dodatna sigurnosna pravila

ADM - FAZE G I H

Faze G i H

Standardi provedbe, rizici i promjene arhitekture

8.1 Standardi provedbe

PODRUČJE	DOGOVOR
API odgovor	svaki endpoint vraća objekt oblika { data, error } radi konzistentnog rukovanja uspjehom i greškom
Baza i migracije	sve promjene sheme idu kroz EF Core migracije; nema ručnog driftanja baze
DTO sloj	request i response modeli odvojeni su od EF entiteta
Validacija	backend validira domenska pravila; frontend radi osnovni unos i prikaz poruka
Statusi	statusne vrijednosti spremaju se kao stringovi radi čitljivosti i lakše provjere
Testni fokus	najvažnije jedinice su izračun cijene i detekcija konflikta termina
Seed podaci	partner tipovi i osnovni predlošci moraju postojati nakon inicijalne migracije

8.2 Definition of done - sažetak po cjelinama

Temelj

- [x] /backend i /frontend se podizu bez dodatnih rucnih improvizacija
- [x] inicijalna baza i seed podaci prolaze na svježoj instalaciji

Vjenčanja

- [x] predlošci i vjenčanja imaju pun CRUD i ispravan statusni tok
- [x] dashboard prikazuje filtriranje po datumu i statusu

Partneri

- [x] partneri, katalog i pravila cijena rade kroz isti model bez dodatnih tip-specifičnih tablica
- [x] CSV import i export rade nad katalogom partnera

Povezivanje i dokumenti

- [x] potvrda partnera blokira se na konflikt termina
- [x] ponuda, račun i interni obračun mogu se generirati iz podataka sustava

8.3 Registar rizika

RIZIK	UTJECAJ	VJEROJATNOST	MITIGACIJA
paralelni rad tima izazove konflikt migracija	srednji	srednja	dogovoriti vlasništvo nad tablicama i redosljed integracije
JSON polja postanu neujednačena između tipova partnera	srednji	srednja	tipizirane forme na frontendu i jasni primjeri metadata struktura
račun cijene vrati pogrešnu vrijednost za poseban datum	visok	niska	jedinični testovi za prioritet specifični datum > posebni dan > osnovna cijena
potvrda partnera propusti konflikt rezervacije	visok	niska	transakcija oko provjere konflikta i kreiranja rezervacije
opsežnost dokumenta i koda ode iznad studentskog kapaciteta	srednji	srednja	držati se MVP granice i ne otvarati dodatne module izvan opsega

8.4 Okidači za promjenu arhitekture

- uvođenje autentifikacije, uloga ili više korisničkih skupina
- potreba da više agencija radi u istoj instalaciji
- integracija s vanjskim servisima za plaćanje, kalendar ili notifikacije
- uvođenje dodatnih tipova događanja kao punopravnih poslovnih tokova
- značajno povećanje volumena podataka koje bi tražilo optimizaciju JSON upita ili drugačiji model spremanja

Kraj arhitekturnog dokumenta

INF-MEG-001 | Verzija 1.0 | 21. travnja 2026.
ADM radna verzija za razvoj, pregled i obranu projekta

Blaž Perić | **Vinko Jakeljić** | **Jelena Vučić** | **Marija Musa**
